

PLAN DE DESARROLLO DE ESCUELAS TEMPORERAS EN LA ZONA CERO


DEPARTAMENTO DE
EDUCACIÓN



Composición de Escuelas- Nivel Isla

De las 841 escuelas con matrícula, se identificaron 60 escuelas con daños críticos, la mayor concentración de estas se encuentran en 4 municipios (**Guánica, Guayanilla, Yauco y Peñuelas**)

841 Escuelas con Matrícula

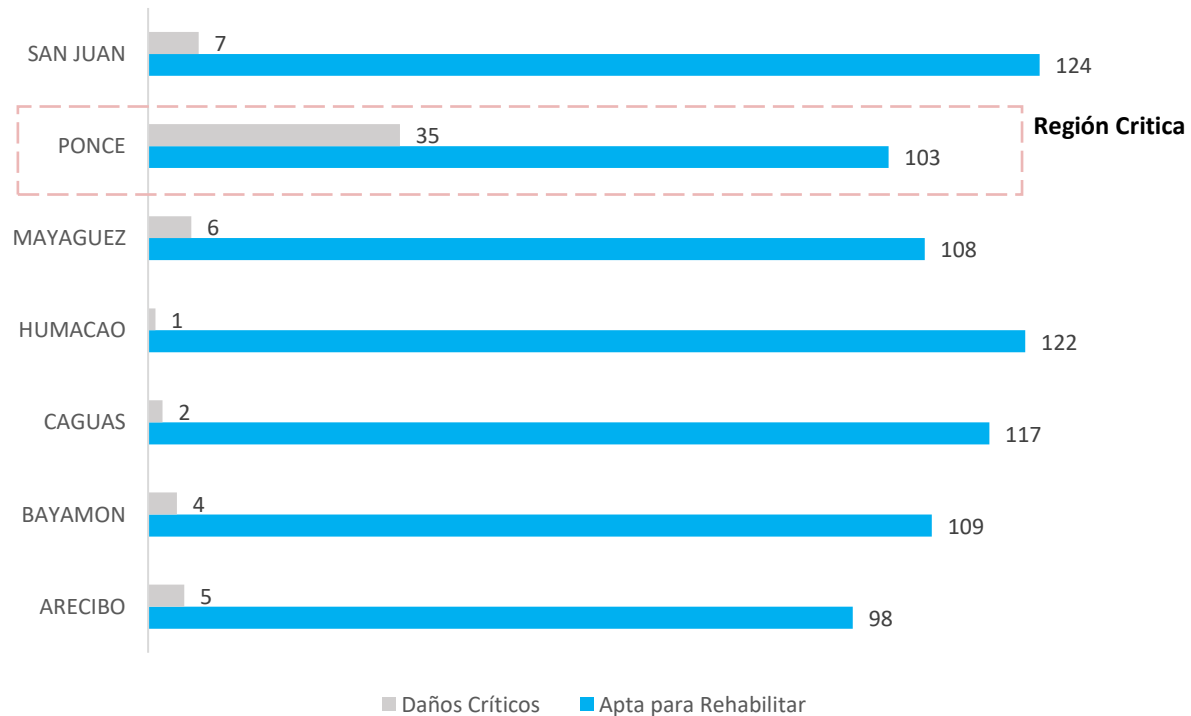

➤ 20 escuelas críticas en 4 municipios:

- Guánica - 6
- Guayanilla - 4
- Yauco- 7
- Peñuelas- 3

Asignación de Fondos

A la fecha se asignaron cerca de \$74.2M para iniciativas que impactan a municipios en el suroeste de la isla:

Fecha	Descripción	Total Fondos
19 de marzo 2021	Autorización FOMB para construcción de modulares en el sur	\$46.4M
23 de marzo 2021	Asignados a AFI para inspecciones de vulnerabilidad sísmica	\$1.0M
14 de abril 2021	Rehabilitación 24 escuelas de OMEP en el suroeste de la isla	\$2.8M
18 de abril 2021	Reparación de 46 escuelas de la AEP en el suroeste de la isla	\$11.9M
23 de abril 2021	Rehabilitar escuelas en desuso en Guánica, Guayanilla, Peñuelas y Yauco	\$3.0M
26 de abril 2021	Reparación de 52 escuelas de OMEP en el suroeste de la isla	\$9.3M



Proceso de Evaluación de Escuelas


Guánica, Guayanilla, Yauco y Peñuelas



15 Escuelas para Rehabilitar



20 Escuelas con Daños Críticos

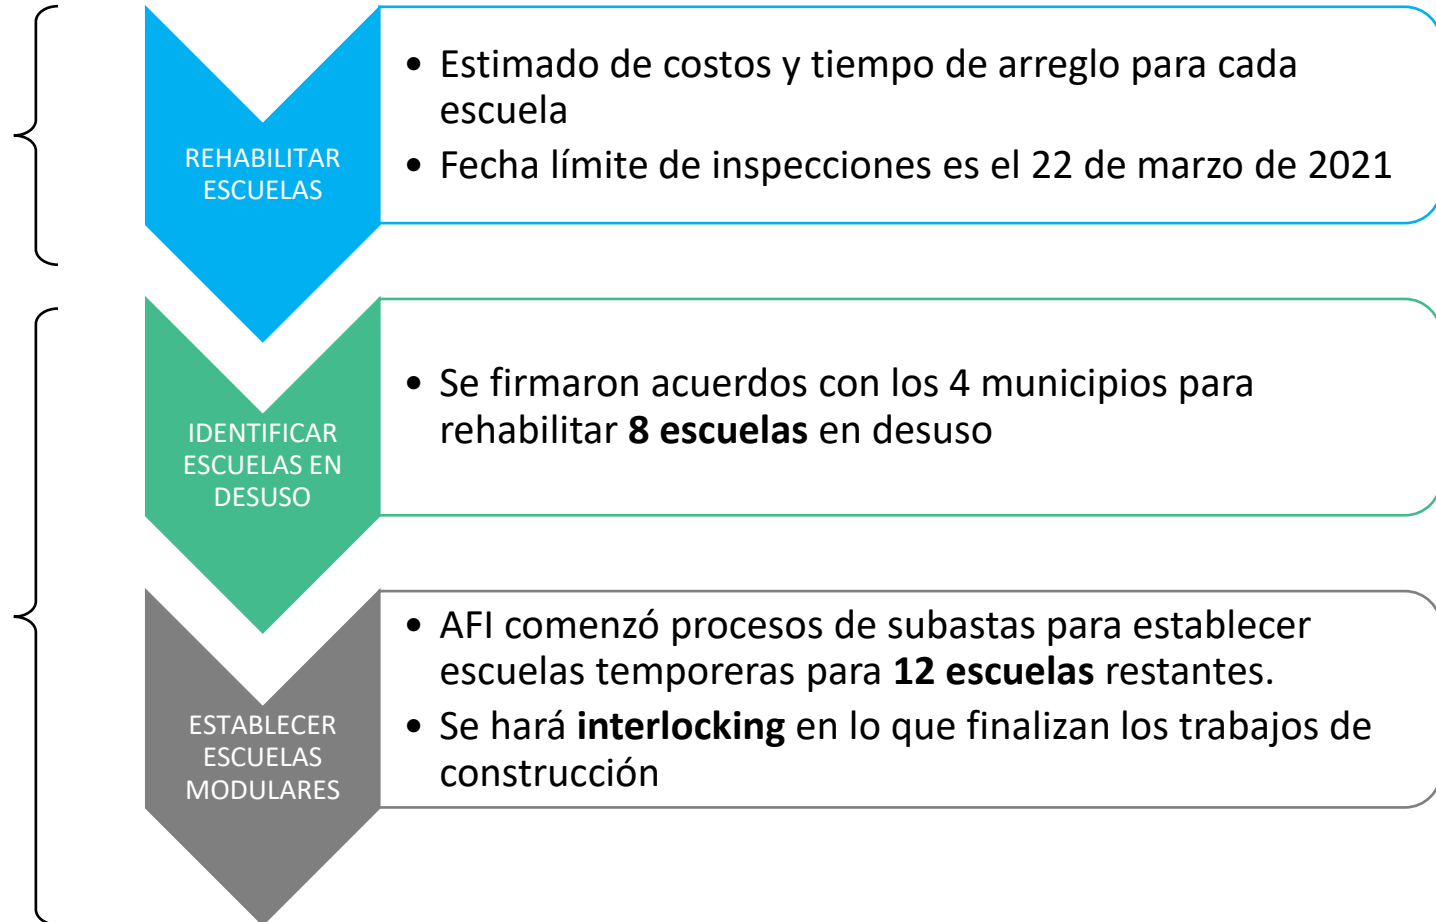

Municipio de Guánica



7 Escuelas



1,183 Estudiantes

Agosto 2021

Estrategia a Corto Plazo:

1 Rehabilitar Escuelas Activas

- María Mc Dougall

2 Rehabilitar Escuelas en Desuso

- Ceferino Lucca **absorbe** Magueyes II
- Franklin D Roosevelt **absorbe** Elsa E. Cuoto

4 Interlocking Escuelas Críticas

- José R. Soto **en** María McDougall
- Luis M. Rivera **en** Ceferino Lucca

\$8.7M Asignados

Octubre 2021 (est.)

Estrategia a Mediano Plazo:

4 Escuelas Modulares

- Agripina Seda (Modulares en Septiembre)
- Aurea Quiles (Modulares en Septiembre)
- Elsa E. Cuoto
- Luis M. Rivera





Agosto 2021

Estrategia a Corto Plazo:

8 Rehabilitar Escuelas Activas

- Almacigo Alto II
- Su Jaime Castañer
- Santiago Negroni
- Lena M Francesh
- Inés María Mendoza
- Superior Ocupacional y Técnica
- Luis Muñoz Rivera
- Luisa Monsegur Vélez

3 Rehabilitar Escuelas en Desuso

- Rafael M. Nadal **absorbe** Ernesto R. Antonini
- Patria Pérez **absorbe** Arturo Lluberas
- Ana M. Negrón **absorbe** Luis A. Ferré

4 Interlocking Escuelas Críticas

- José Onofre Torres **en** Luisa Monsegur
- Loaiza Cordero **en** Ana M. Negrón
- Benicia Vélez **en** Inés María Mendoza
- Elvira Vicente **en** Rafael M. Nadal

\$18.5M Asignados

Octubre 2021 (est.)

Estrategia a Mediano Plazo:

4 Escuelas Modulares

- José Onofre Torres
- Loaiza Cordero
- Benicia Vélez
- Elvira Vicente



Municipio de Guayanilla



6 Escuelas



1,886 Estudiantes

Agosto 2021

Estrategia a Corto Plazo:

2 Rehabilitar Escuelas Activas

- Asunción Rodríguez
- Gloria M. Borrero

2 Rehabilitar Escuelas en Desuso

- Francisco R. López **absorbe** Arístides Q.
- Padre Nazario **absorbe** Dalila Torres

2 Interlocking Escuelas Críticas

- Hipólito García **en** Francisco R López
- Herminio Arzola **en** Gloria M. Borrero

\$5.0M Asignados

Octubre 2021 (est.)

Estrategia a Mediano Plazo:

2 Escuelas Modulares

- Hipólito García
- Herminio Arzola



Municipio de Peñuelas



7 Escuelas



2,223 Estudiantes

Agosto 2021

Estrategia a Corto Plazo:

4 Rehabilitar Escuelas Activas

- Rafael Irizarry Rivera
- Miguel González Bauzá
- Webster
- Intermedia Tallaboa Alta

1 Rehabilitar Escuelas en Desuso

- Adolfo Grana Rivera **absorbe** Josefa Bauzá

2 Interlocking Escuelas Críticas

- Su Jorge L. Valdivieso **en** Rafael I. Rivera
- Ramón Pérez Purcell **en** Webster

\$5.9M Asignados

Octubre 2021 (est.)

Estrategia a Mediano Plazo:

2 Escuelas Modulares

- Su Jorge L. Valdivieso
- Ramón Pérez Purcell



Inspecciones “Columnas Cortas”- AFI

En conjunto a los esfuerzos de rehabilitación, comenzaron las inspecciones de vulnerabilidad sísmica para 726 escuelas. Se espera que los resultados estén disponibles dentro de las próximas dos (2) semanas y así iniciar los trabajos de reparación.



75%

Inspecciones Realizadas

Inspecciones Realizadas

